

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 11/06/2025

Inspecteur: Bavo Velghe

Mentor:

Installateur: Luvicus BV

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0798 675 135

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481235

Datum verslag: 11/06/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: **Bunderstraat**
Huisnummer: 3
Busnummer:
Postcode: 9450
Gemeente: HAALTERT
Land: België

Eigenaar

Naam: PSK Build
Straatnaam: Bunderstraat
Huisnummer: 3
Busnummer:
Postcode: 9450
Gemeente: HAALTERT
Land: België

Installateur

Naam: Luvicus BV
BTW nr.: BE 0798 675 135
Telefoonnummer: +32 498 76 78 69
E-mail: info@luvicus.be

Type : woning

EAN : 541

Teller Nr. : 32967831

☒ Niet meegegeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor
01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 24

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2,63 MΩ

RE: 8,43 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	24	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's in bijlage	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 11/6/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:32 tot 11:17

De inspecteur Bavo Velghe

Bavo Velghe

Bavo Velghe

ACEG VZW - #184

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 11/6/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



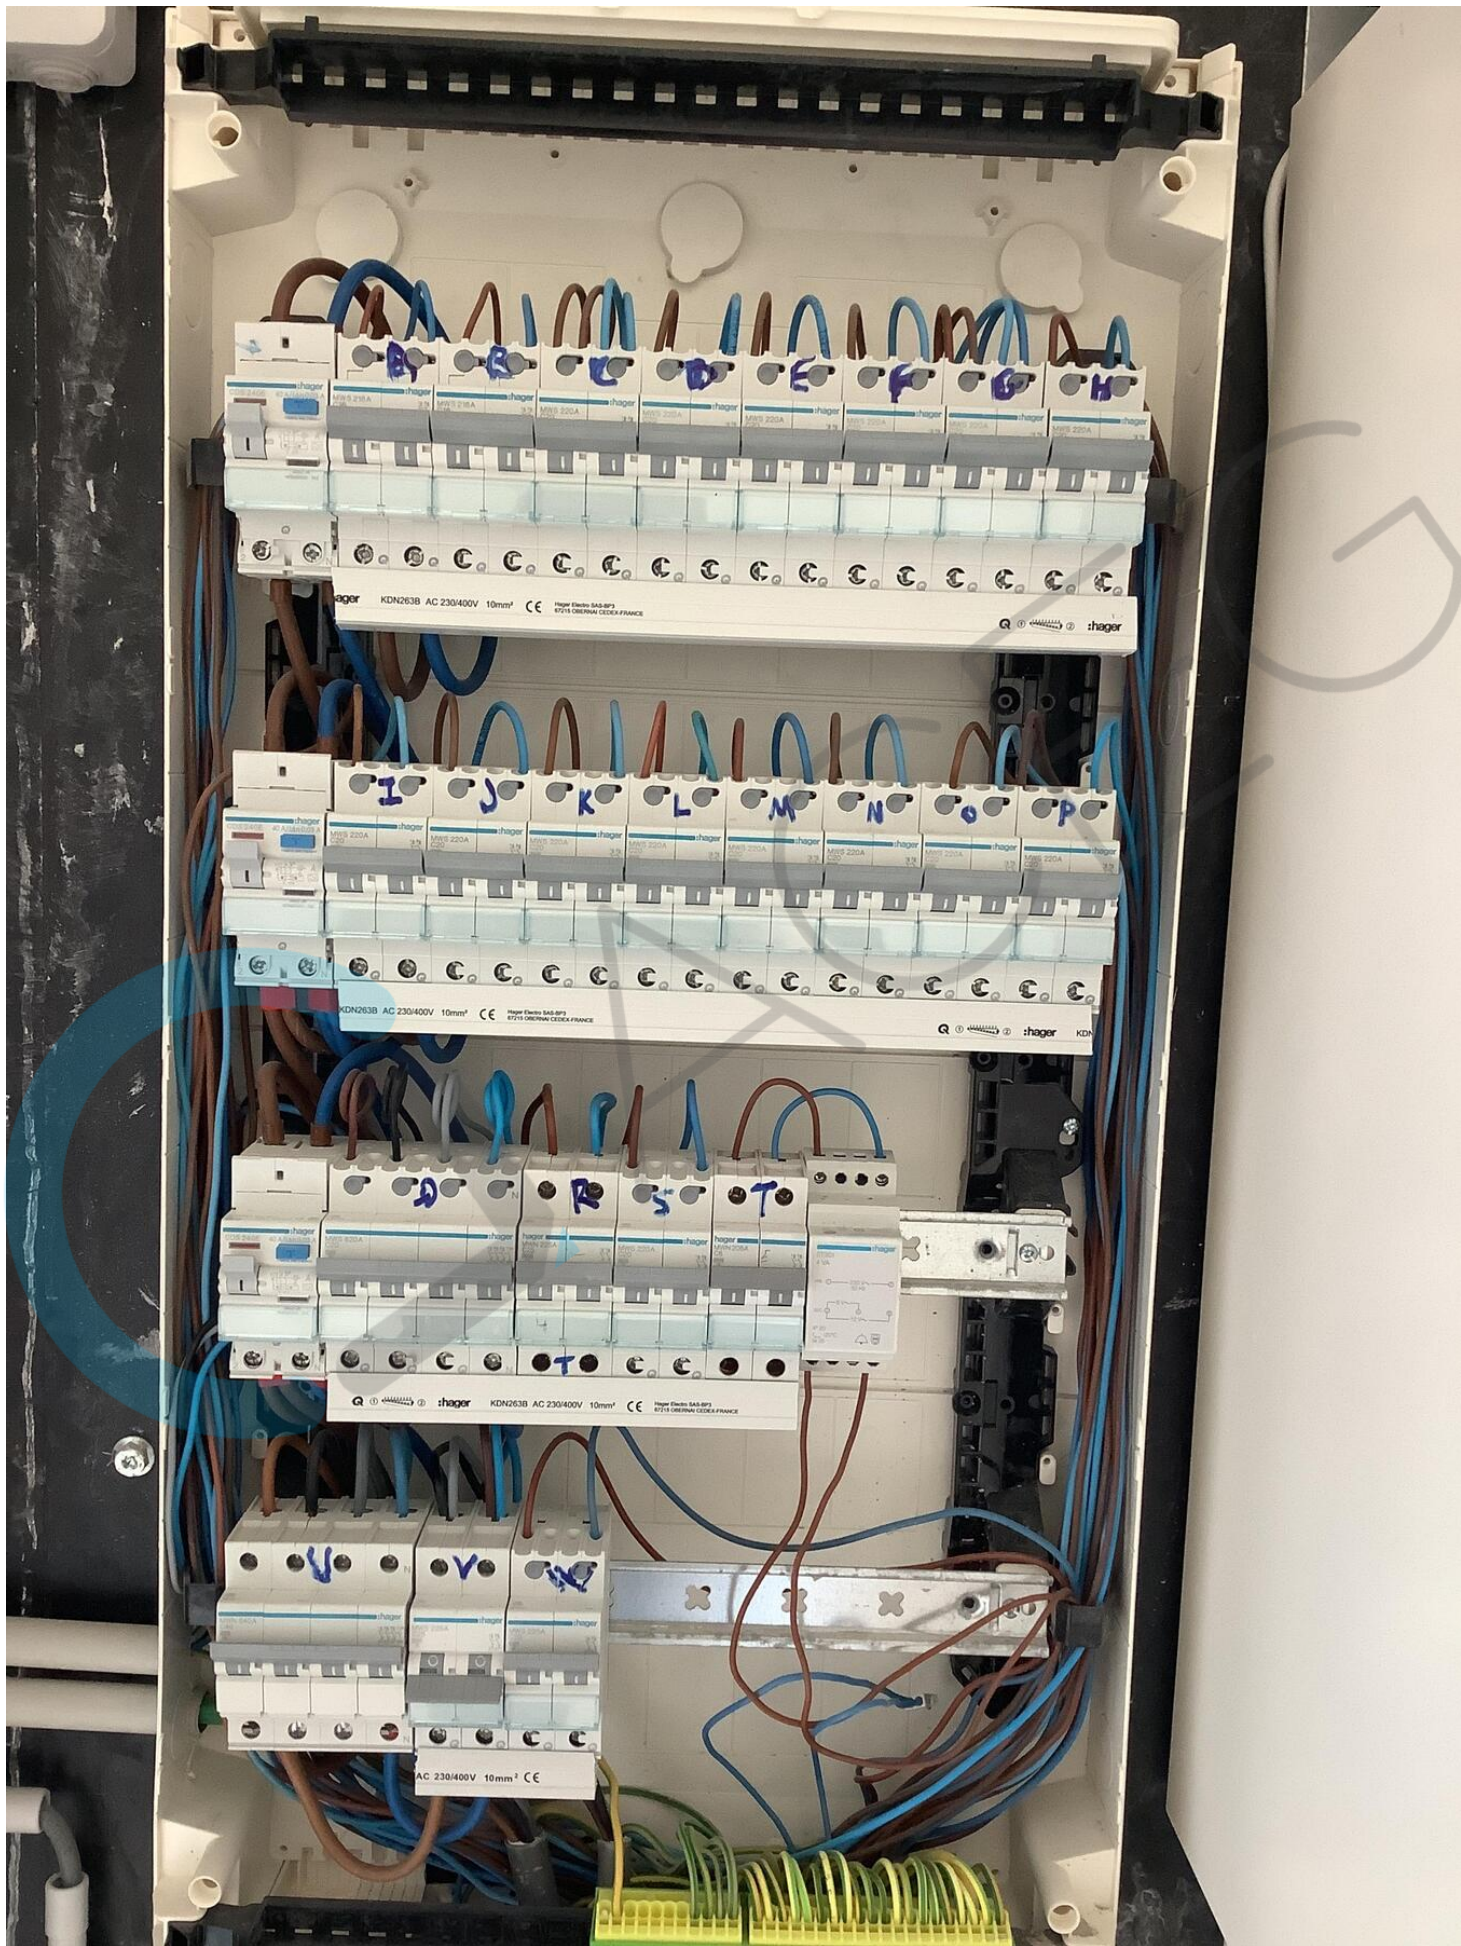



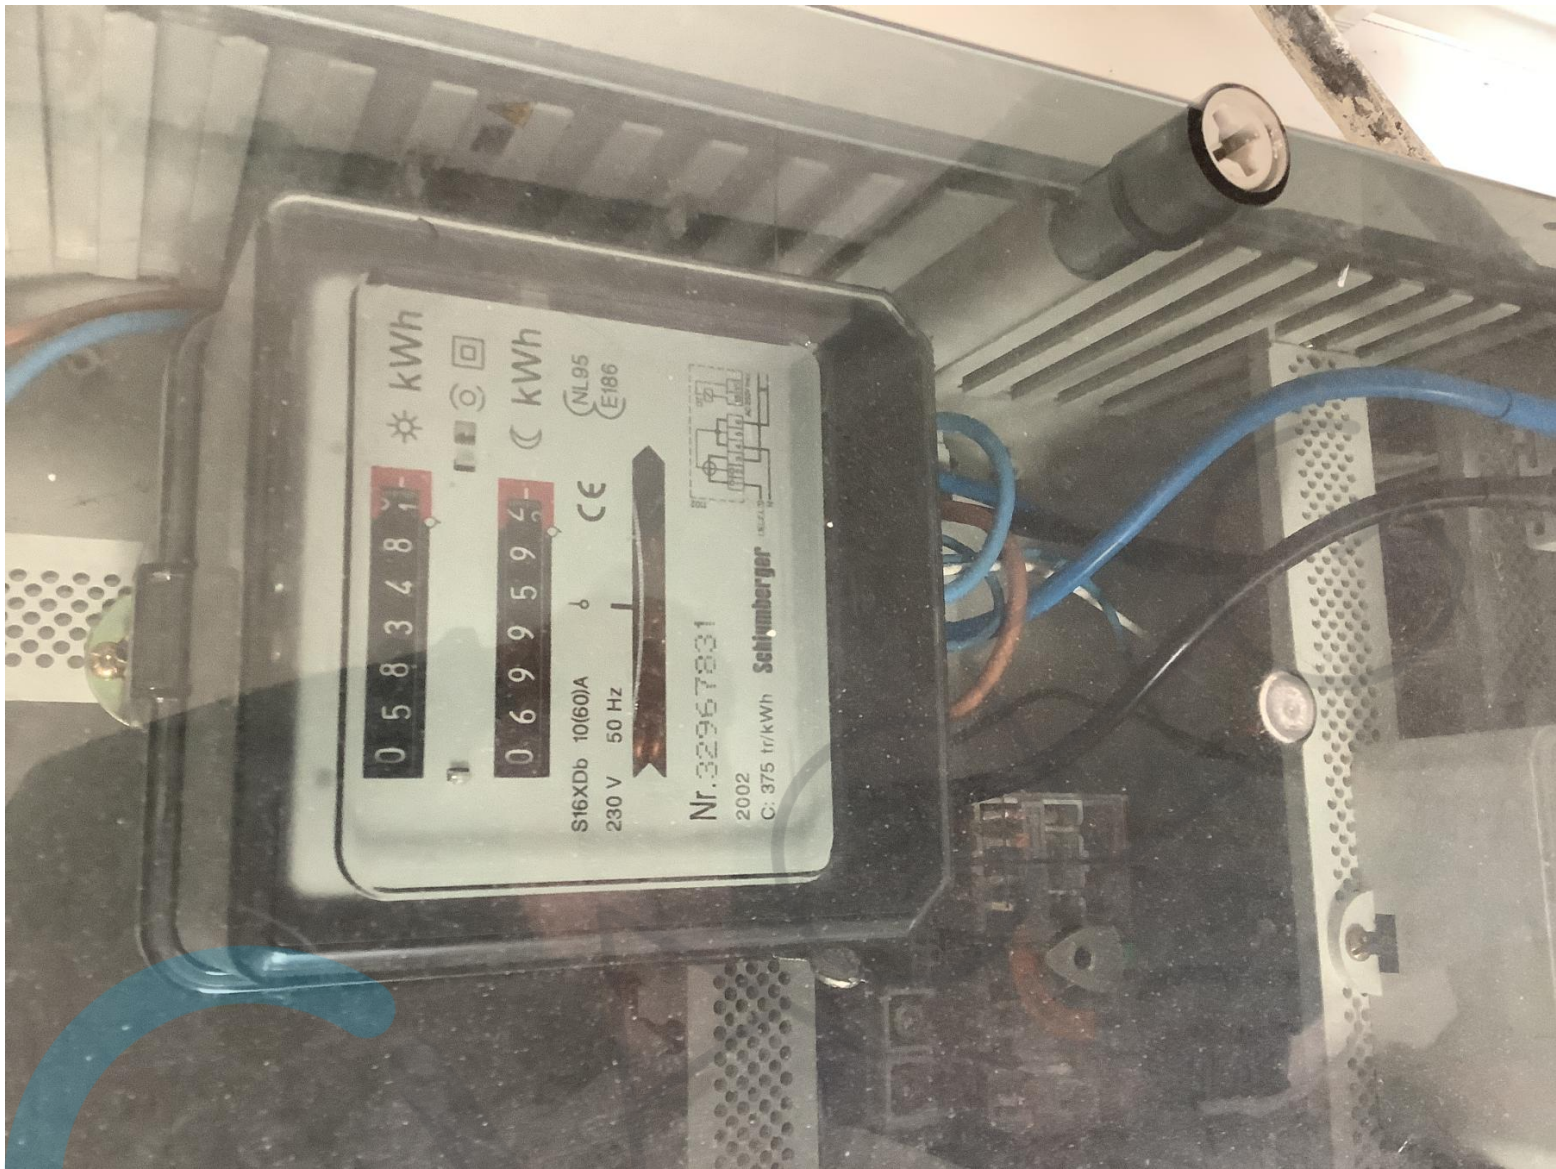

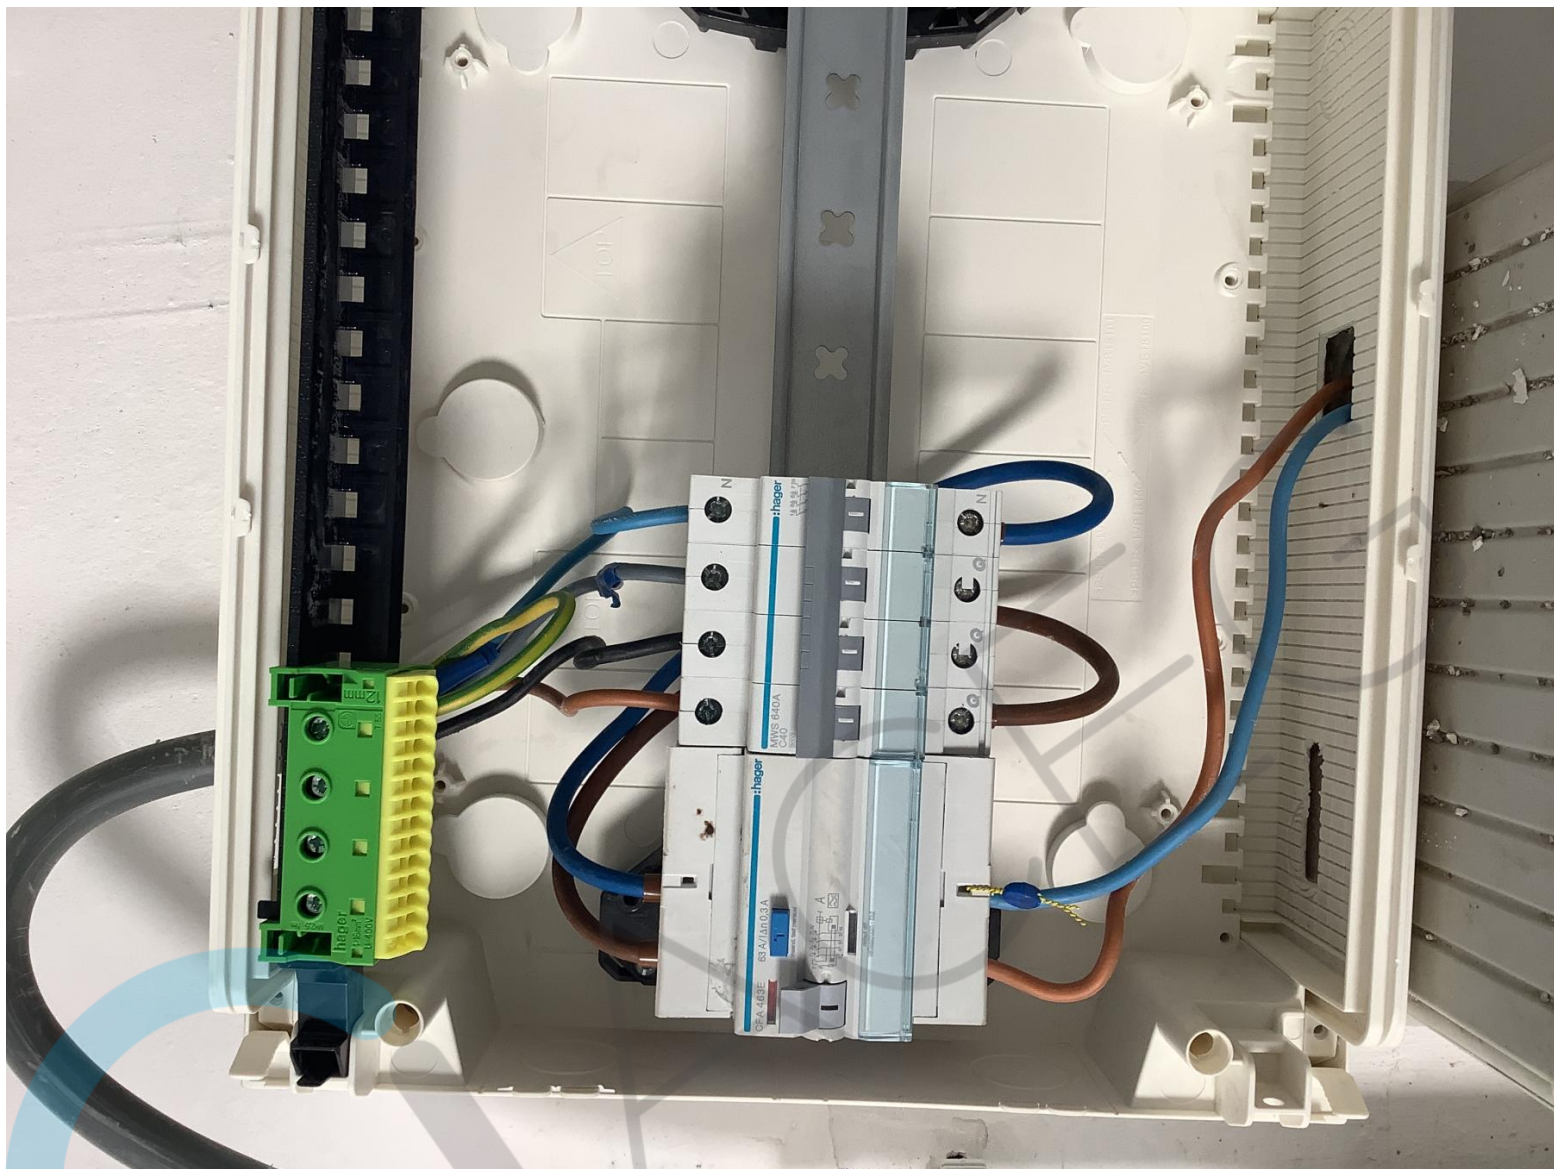





EXVB 4x10 10000 2P - 40A kWh VOB 2x10 Type A - Δ300mA 3000 4P - 63A

BORD 1

1A

Naar bord 2

XVB 5G6

4P - C 40A

Van bord 1

BORD 2

XVB 5G6

Plaats van de elektrische installatie

PSK BUILD
Bunderstraat
9450 Haaltert

Installateur

Luvicus
Buisstraat 10
9200 Dendermonde
GSM: +32 498 76 78 69
e-mail: info@luvicus.be
BTW BE 0746.893.565


p. 1/5


Eendraadschema

Datum: 11/06/2025

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-06-11 07:49:38

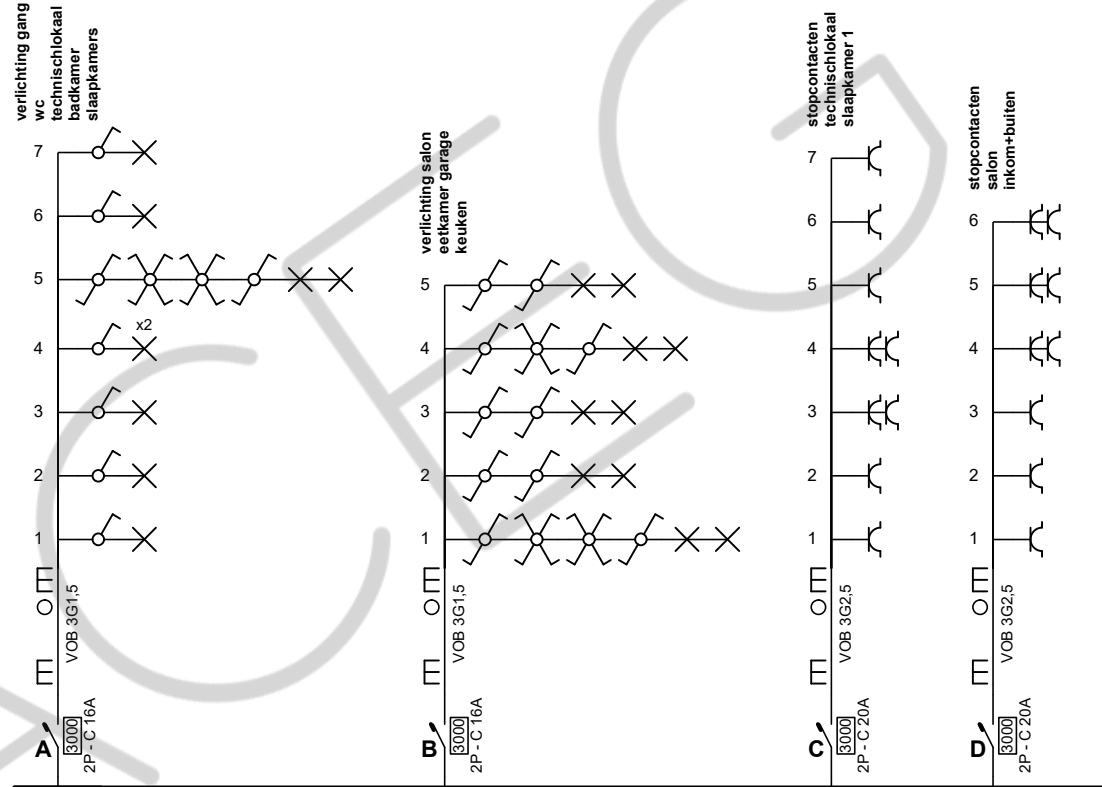

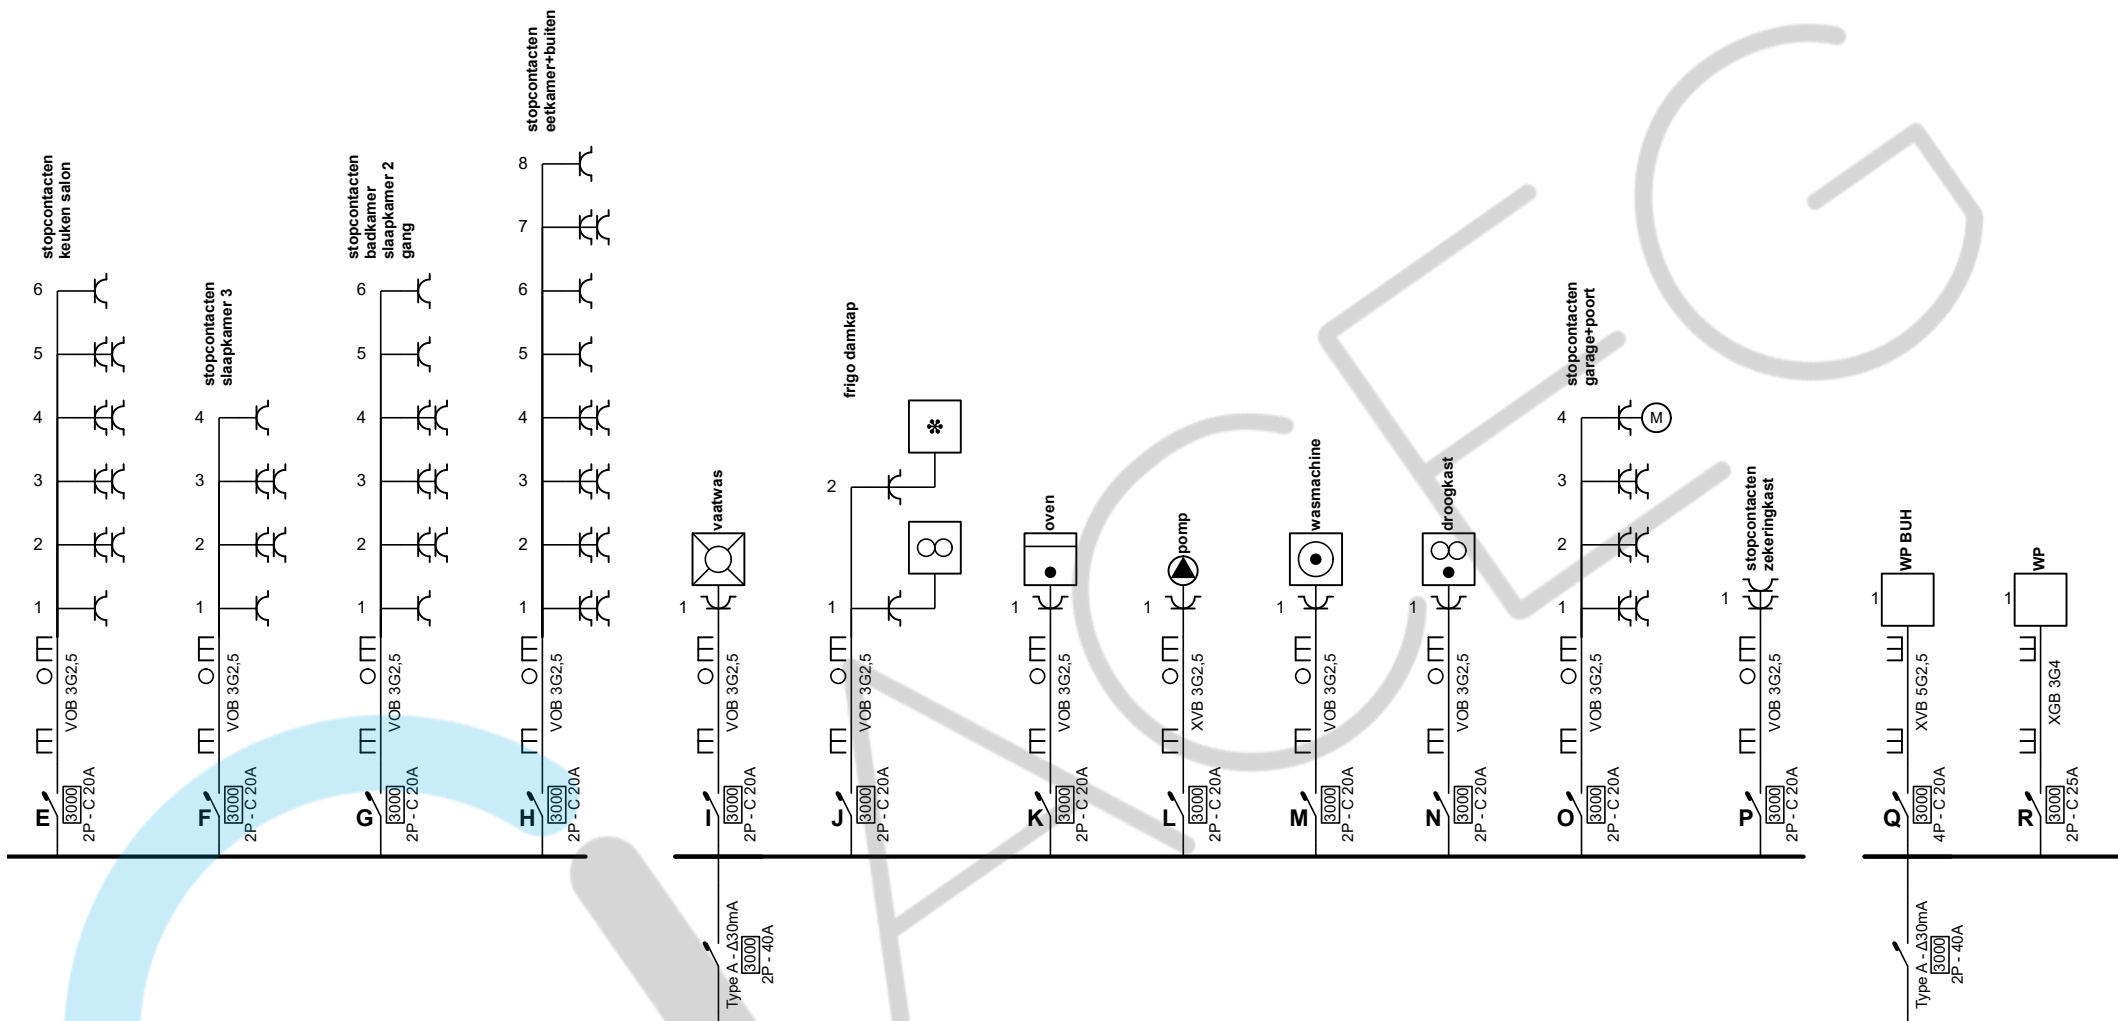

Bavo Velghe

Bavo Velghe

ACEG VZW - #184

11/06/2025

Plaats van de elektrische installatie

PSK BUILD
Bunderstraat
9450 Haaltert

Installateur


Luvicus
Buisstraat 10
9200 Dendermonde
GSM: +32 498 76 78 69
e-mail: info@luvicus.be
BTW BE 0746.893.565

p. 2/5 Eendraadschema

Datum: 11/06/2025

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-06-11 07:49:38

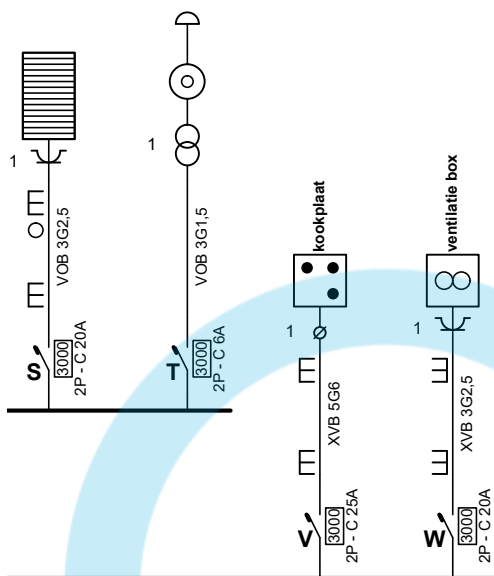

Bavo Velghe

Bavo Velghe

ACEG VZW - #184

11/06/2025

Plaats van de elektrische installatie

PSK BUILD
Bunderstraat
9450 Haaltert

Installateur


Luvicus
Buisstraat 10
9200 Dendermonde
GSM: +32 498 76 78 69
e-mail: info@luvicus.be
BTW BE 0746.893.565

**p. 3/5
Eendraadschema**

Datum: 11/06/2025

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-06-11 07:49:38

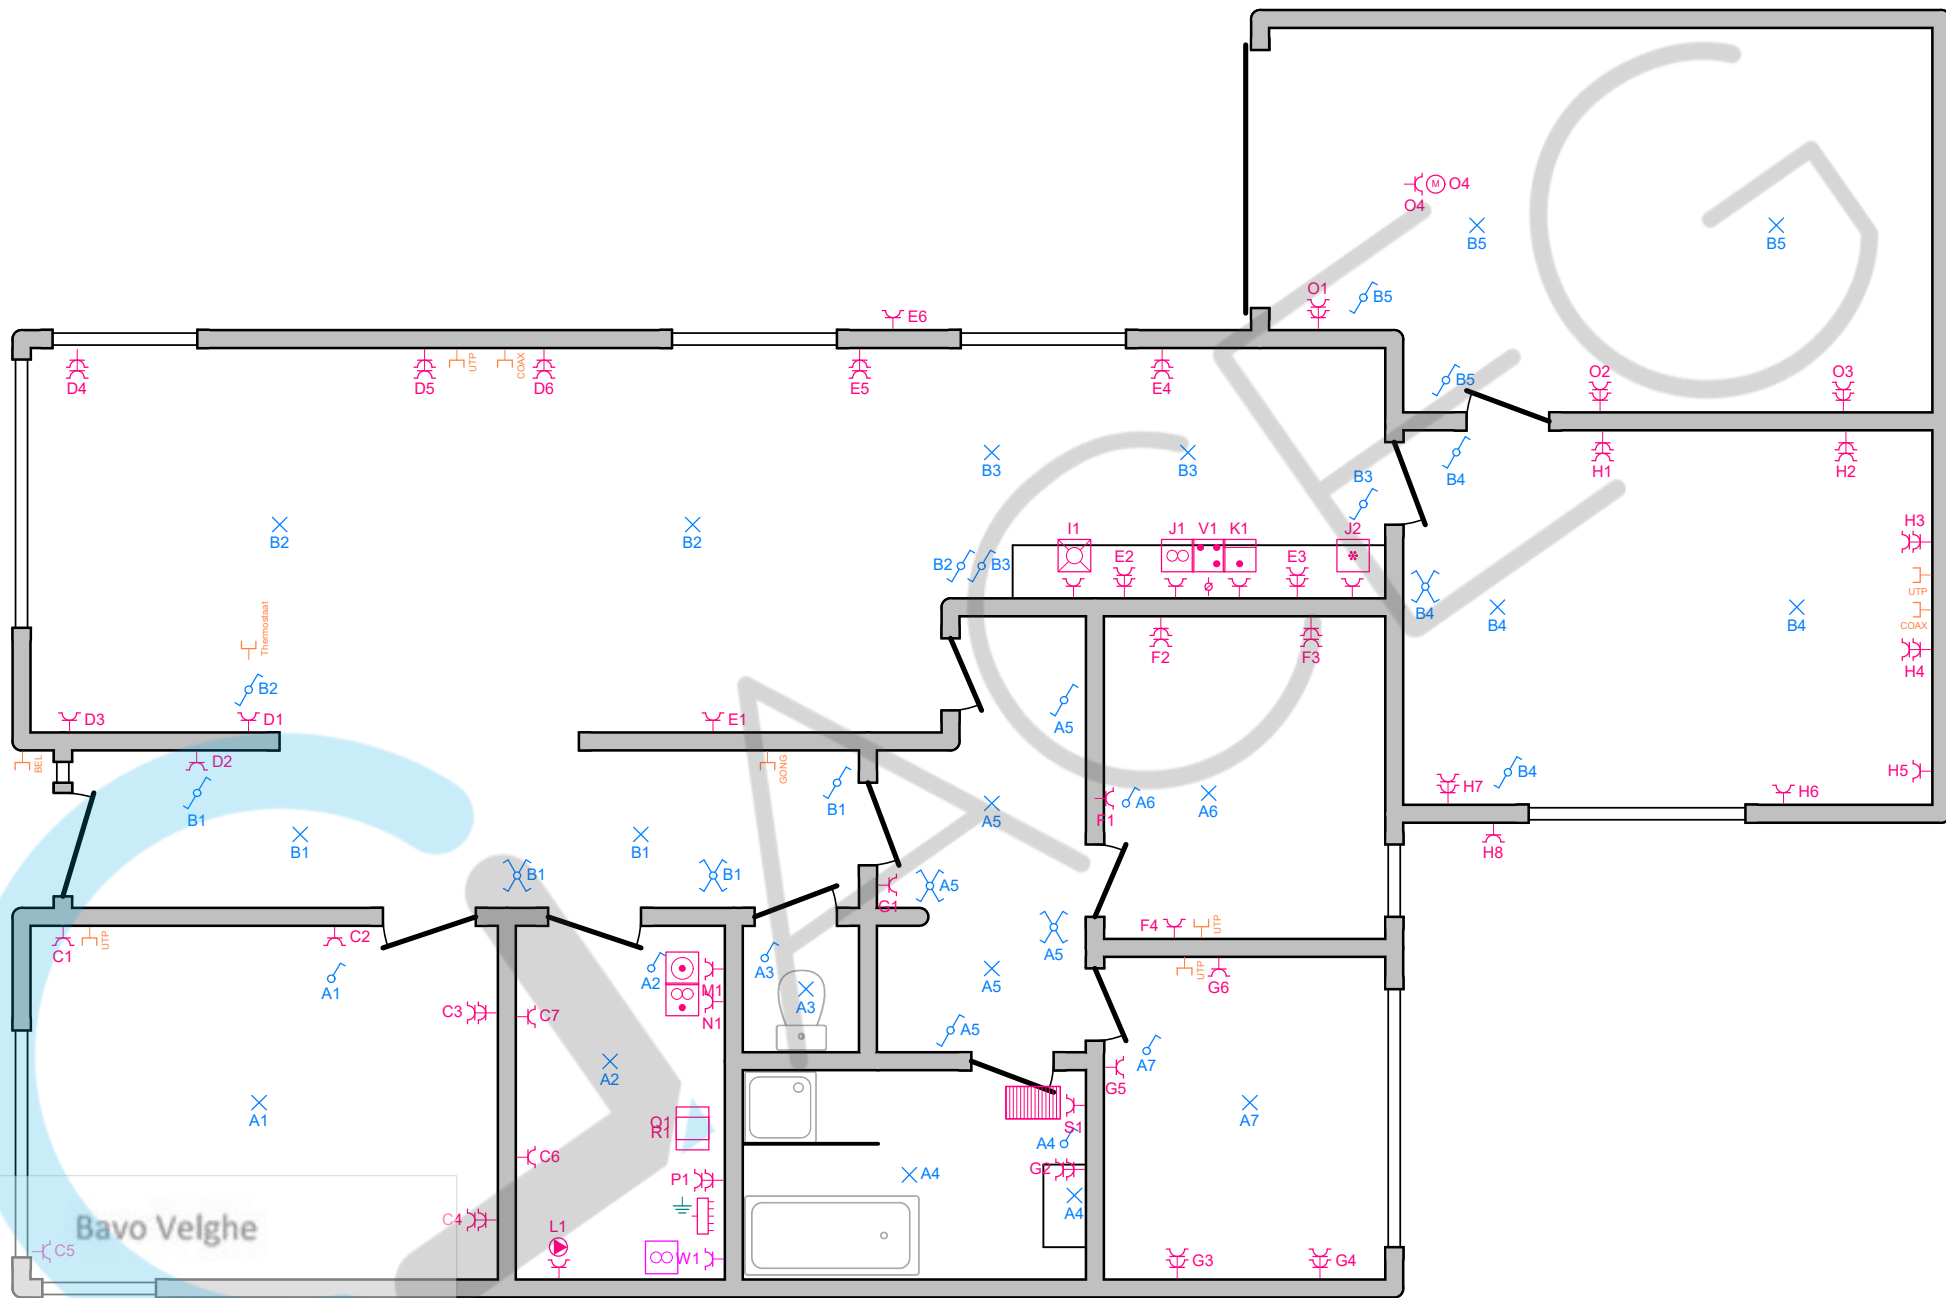

Bavo Velghe

Bavo Velghe

ACEG VZW - #184

11/06/2025

Plaats van de elektrische installatie

PSK BUILD
Bunderstraat
9450 Haaltert

Installateur

Luvicus
Buisstraat 10
9200 Dendermonde
GSM: +32 498 76 78 69
e-mail: info@luvicus.be
BTW BE 0746.893.565

p. 4/5 Situatieplan

Datum: 11/06/2025

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-06-11 07:49:38

BORD 1	
1A	
BORD 2	
U	
A	verlichting gang wc technischlokaal badkamer slaapkamers
B	verlichting salon eetkamer garage keuken
C	stopcontacten technischlokaal slaapkamer 1
D	stopcontacten salon inkom+buiten
E	stopcontacten keuken salon
F	stopcontacten slaapkamer 3
G	stopcontacten badkamer slaapkamer 2 gang
H	stopcontacten eetkamer+buiten
I	vaatwas
J	frigo damkap
K	oven
L	pomp
M	wasmachine
N	droogkast
O	stopcontacten garage+poort
P	stopcontacten zekeringkast
Q	WP BUH
R	WP

S	
T	
V	kookplaat
W	ventilatie box

Plaats van de elektrische installatie
 PSK BUILD
 Bunderstraat
 9450 Haaltert

Installateur
 Luvicus
 Buisstraat 10
 9200 Dendermonde
 GSM: +32 498 76 78 69
 e-mail: info@luvicus.be
 BTW BE 0746.893.565

p. 5/5
Lijst Kringen

Datum: 11/06/2025

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-06-11 07:49:38

11/06/2025

ACEG VZW - #184
